

2017

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS



**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2016**

Proyectos de Inversión Pública

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 1 | 342982 | MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA CALLE ROMA , INCLUYENDO PLAZUELA AUGUSTO DURAND Y PLAZUELA DOMINGO GARCÍA RADA, EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,200,000.00 | 1,455,648.00 | 0.00 | Pip Viable |
| 2 | 1 | - | PROYECTO EN EJE ROCA DE VERGALLO PARQUE POLAR | | - | - | Perfil por elaborar |
| 3 | 1 | 208839 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. NICOLAS DE RIBERA Y CALLE SALAMANCA , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 3,130,516.00 | 0.00 | Perfil inactivo gestionando su activación |
| 4 | 1 | 343278 | MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VALLE Riestra EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 821,618.05 | 0.00 | PIP Viable |
| 5 | 2 | - | MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GOSTA LETTERSTEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA | 2,200,000.00 | - | - | Perfil en elaboración |
| 6 | 2 | - | MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA COMPRENDIDA POR GRAL. LA FUENTE, VALLE Riestra, PEREZ ARANIBAR Y SALAVERRY | | - | - | Perfil por elaborar |
| 7 | 2 | - | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOS MANZANOS, ANTUNEZ DE MAYOLO Y ANCHORENA | | - | - | Perfil por elaborar |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 8 | 3 | - | MEJORAMIENTO DE LA AV. CONQUISTADORES Y STA. LUISA | 2,200,000.00 | - | - | Perfil en elaboración |
| 9 | 3 | - | MEJORAMIENTO URBANÍSTICO, VIAL, PEATONAL Y PAISAJISTICO DE VARIAS CALLES (BASADRE, CAMINO REAL, CHOQUEHUANCA, STA. CRUZ, LYNCH, LORD COCHRANE, LLANO ZAPATA) | | - | - | Perfil por elaborar |
| 10 | 4 | - | MEJORAMIENTO DE LA AV. COLOMBIA Y AV. DEL PARQUE | 2,200,000.00 | - | - | Perfil en elaboración |
| 11 | 4 | - | MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 311,669.83 | 0.00 | PIP Viable |
| 12 | 4 | - | MEJORAMIENTO URBANO DE LA ZONA COMPRENDIDA POR LA CALLE PERCY GISON AV. PASEO PARODI, JAVIER PRADO ESTE Y AV. PETIT THOUARS | | - | - | Perfil por elaborar |
| 13 | 5 | 112856 | ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (También en PP 2013) | 2,200,000.00 | 4,200,614.00 | 1,130,615.08 | Expediente Técnico en elaboración |
| | | | | 11,000,000.00 | 9,920,065.88 | 1,130,615.08 | |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO URBANO DEL EJE DE LA CALLE ROMA,
INCLUYENDO PLAZUELA AUGUSTO DURANDY
PLAZUELA DOMINGO GARCIA RADA, EN EL SECTOR I**

**PRE INVERSIÓN:
PIP VIABLE**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GOSTA LETTERSTEN
Y ALBERTO HURTADO ABADÍA,
DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA**

**PRE INVERSIÓN:
PERFIL EN ELABORACION**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA
EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA**

**PRE INVERSIÓN:
PIP VIABLE**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DE
LA CALLE GENERAL FRANCISCO VALLE RUESTRA
EN EL SECTOR I, DISTRITO DE SAN ISIDRO -LIMA- LIMA**

**PRE INVERSIÓN:
PIP VIABLE**

RENDICIÓN DE CUENTAS



**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2015**

Proyectos de Inversión Pública

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 328246 | AMPLIACION DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA (MODULO DE SERENAZGO) EN LA INTERSECCION DE LA AV. CADIZ CON CALLE ROMA , SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,100,000.00 | 142,775.00 | 0.00 | PIP Viable |
| 2 | 1 | 345898 | MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE ALFONSO UGARTE EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 4,162,457.00 | 0.00 | PIP Viable |
| 3 | 1 | - | REMOLACION Y MEJORAMIENTO DE LA HUACA HUALLAMARCA | | - | - | Perfil por elaborar |
| 4 | 1 | 331425 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV GUILLERMO PRESCOTT Y CUADRA 1 DE LA CA LAS FLORES EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 3,994,045.00 | 0.00 | PIP Viable |
| 5 | 1 | 331391 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 1,344,436.00 | 5,100.00 | Expediente Tecnico en elaboración |
| 6 | 2 | - | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN A NIVEL PEATONAL DE LA AV. GRAL PEZET DESDE LA AV. CORONEL PORTILLO HASTA LA AV. CAMINO REAL | 2,100,000.00 | - | - | Perfil por elaborar |
| 7 | 2 | 112087 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. CAPITAN OCTAVIO ESPINOSA Y LA CA. JUAN DELLEPIANI ENTRE LA AV. ALBERTO DEL CAMPO Y CA. GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 2,918,153.00 | 0.00 | PIP Viable |
| 8 | 2 | - | CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA INTERCONECTADAS MEDIANTE FIBRA OPTICA AL CENTRO DE CONTROL | | - | - | Perfil en elaboración |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 9 | 3 | 273659 | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,100,000.00 | 5,007,036.00 | 90,829.56 | Expediente Técnico en elaboración |
| 10 | 4 | 281596 | INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | - | 703,334.39 | 518,247.94 | Ejecutado |
| 11 | TODOS | 339783 | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES SUBTERRÁNEOS PARA CASOS DE EMERGENCIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,100,000.00 | 9,218,445.00 | 0.00 | PIP Viable en revisión |
| 12 | 4 | 315862 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ATENCION MEDICA BASICA Y CONTROL SANITARIO EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | - | 855,494.29 | 0.00 | Proceso de selección para la adquisición |
| 13 | 5 | - | CENTRO DE ATENCION DE SALUD (ESSALUD) | 2,100,000.00 | - | - | Perfil por elaborar |
| | | | | 10,500,000.00 | 28,346,175.68 | 614,177.50 | |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE ALFONSO UGARTE EN EL SECTOR I

**PRE INVERSIÓN:
PIP VIABLE**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO URBANO DE LA
AV. GUILLERMO PRESCOTTY
CUADRA I DE LA CALLE LAS FLORES
EN EL SECTOR I**

**PRE INVERSIÓN:
PIP VIABLE**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO URBANO DE
LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR I**

**INVERSIÓN:
EXP.TEC. EN ELABORACION**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO URBANO – VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO



**INVERSIÓN:
EXP.TEC. EN ELABORACION**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Proyectos de Inversión Pública



INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIOS TEMPORAL ANTE DESASTRES

**INVERSIÓN:
EJECUTADO**



RENDICIÓN DE CUENTAS



**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2014**

Proyectos de Inversión Pública

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 1 | 205466 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCONI EN EL SECTOR 1, SUB SECTOR 1 – 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,000,000.00 | 1,040,183.95 | 871,772.70 | Obra culminada en el 2015 |
| 2 | 1 | 275239 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LA CALLE LAS MORERAS, BALTAZAR LA TORRE Y GRAL FRANCISCO VALLE RIESTRA EN EL SUB.SECTOR 1-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 77,661.26 | 48,928.25 | Obra culminada 2015 - Convenio EDELNOR |
| 3 | 1 | 275144 | MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. EL ROSARIO , SUBSECTOR 1-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 1,123,973.00 | 553,025.14 | Obra culminada en el 2015 |
| 4 | 2 | 273927 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO , SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,000,000.00 | 1,439,417.00 | 631,426.17 | Obra en ejecución |
| 5 | 2 | 209479 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII Y GOSTA LETTERSTEN , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 984,547.24 | 0.00 | Perfil inactivo |
| 6 | 2 | 209344 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 834,153.53 | 785,912.34 | Obra culminada en el 2015 |
| 7 | 2 | 208486 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL- CASA DEL VECINO DEL SECTOR 02 SAN ISIDRO , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (También en PP 2012) | | 3,571,144.00 | 0.00 | Perfil Viable |
| 8 | 3 | 193828 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. (También en PP 2012 y 2011) | 2,000,000.00 | 4,136,265.00 | 996,631.75 | Obra en ejecución |
| 9 | 4 | 272479 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION MALIBU , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,000,000.00 | 1,162,156.48 | 809,705.68 | Obra culminada en el 2015 |
| 10 | 4 | 271910 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 858,913.34 | 797,887.95 | Obra culminada en el 2015 |
| 11 | 4 | 271511 | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 619,234.37 | 317,219.67 | Obra culminada en el 2015 |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 12 | 5 | 271614 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PASEO DE LOS POETAS TRAMO AV. DEL PARQUE NORTE – AV. CANAVAL MOREYRA URB. EL PALOMAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 2,000,000.00 | 724,355.88 | 816,853.62 | Obra culminada en el 2015 |
| 13 | 5 | 271584 | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE SERENAZGO EN EL PUENTE QUIÑONES EN LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 90,999.37 | 110,825.26 | Obra culminada en el 2015 |
| 14 | 5 | 274047 | MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL ENTRE LA CDRA. 7 Y 8 DE LA AV. DEL PARQUE NORTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 287,462.00 | 286,226.57 | Obra culminada en el 2015 |
| 15 | 5 | 271530 | MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL, CUADRA 1 Y 2 DE LA AV. PABLO CARRIQUIRY URB. EL PALOMAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 645,138.50 | 457,323.46 | Obra culminada en el 2015 |
| 16 | 5 | 273069 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DEL PARQUE SUR CON LA CALLE DR. RICARDO J. ANGULO RAMÍREZ DE LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 331,644.15 | 129,277.18 | Obra culminada en el 2014 |
| 17 | 5 | 271594 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 832,996.72 | 828,641.60 | Obra en ejecución |
| 18 | 5 | 204474 | MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 4,015,567.00 | 164,867.48 | Obra culminada en el 2015 |
| 19 | 5 | 274856 | MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE PAPA JUAN PABLO II DE LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 188,800.96 | 211,214.52 | Obra culminada en el 2015 |
| | | | | | 10,000,000.00 | 22,964,613.75 | 8,000,885.72 |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCONI EN EL SECTOR I, SUB SECTOR I-I



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/. 871,772.71


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE
LAS CALLES MORERAS, BALTAZAR LA TORRE
Y GRAL. FRANCISCO VALLE RIESTRA
EN EL SECTOR I-4**

**INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/.39,928.25**

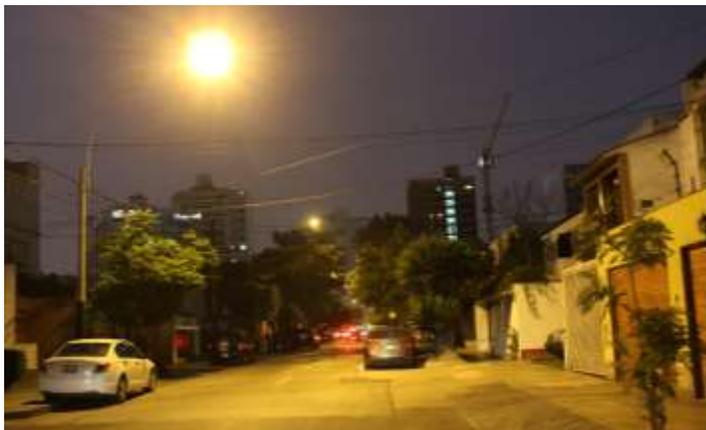

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. EL ROSARIO SUB SECTOR I-4



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/.560,479.73

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUB SECTOR 2-2 Y 2-3



**INVERSIÓN:
OBRA EN EJECUCIÓN
S/.631,426.17**



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO

INVERSIÓN: OBRA CULMINADA 2015
S/.709,390.07



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2



INVERSIÓN:
OBRA EN EJECUCIÓN
S/.4'469,458.75




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN

**INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/.752,239.56**

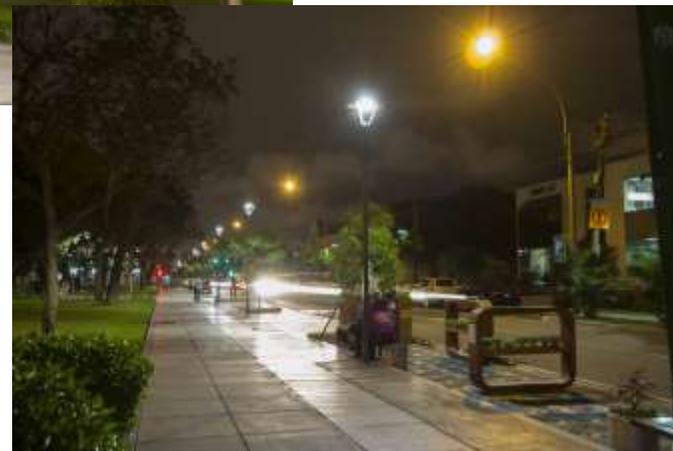

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO URBANO – VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO

**INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/. 296,214.29**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN Y LA SEGURIDAD EN EL PASEO DE LOS POETAS



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/.770,366.04

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE SERENAZGO EN EL PUENTE QUIÑONES EN LA URBANIZACIÓN CÓRPAC



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/. 103,734.35

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



**MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL
DE LA AVENIDA DEL PARQUE NORTE,
ENTRE LA CUADRAS 7 Y 8**

**INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/.281,890.21**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. PABLO CARRIQUIRY, CUADRAS 1 Y 2, URB. EL PALOMAR

INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/.437,153.73

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA INTERSECCION DE LA AV. PARQUE SUR CON CALLE RICARDO ANGULO



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2014
S/. 126,200.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31, ENTRE LAS CALLES 24 Y 25



**INVERSIÓN:
OBRA EN EJECUCIÓN
S/. 806,708.76**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO DEL SECTOR 5



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/. 160,600.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE PAPA JUAN PABLO II DE LA URBANIZACIÓN CÓRPAC



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/. 202,016.50

RENDICIÓN DE CUENTAS



**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2013**

Proyectos de Inversión Pública

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 1 | 193799 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB. SECTOR 1 - 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 237,429.00 | 257,988.14 | Obra culminada y Liquidada en 2014 |
| 2 | 1 | 203225 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CÁDIZ EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 414,084.85 | 421,655.10 | Obra culminada y Liquidada en 2014 |
| 3 | 2 | 261345 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LAS VIAS DEL SECTOR 02 , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 979,368.00 | 289,728.27 | Obra culminada 2015 - Convenio con EDELNOR |
| 4 | 3 | 204573 | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPÚBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. | 1,200,000.00 | 3,517,163.00 | 2,337,351.47 | Obra culminada el 2014 Liquidada en 2015 |
| 5 | 3 | 203961 | MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUB SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 3,232,878.00 | 2,788,572.13 | Obra culminada y Liquidada en 2014 |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6 | 4 | 209110 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 3,593,598.00 | 140,015.00 | Expediente Técnico en revisión |
| 7 | 5 | 211524 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 939,531.84 | 1,207,267.96 | Obra culminada y liquidada en 2014 |
| 8 | 5 | 203254 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUBSECTOR 5-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 253,225.45 | 319,375.27 | Obra culminada, liquidada y PIP CERRADO en 2014 |
| 9 | 5 | 112856 | ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. REPORTADO EN 2016 | | | | |
| | | | | 6,000,000.00 | 13,167,278.14 | 7,761,953.34 | |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LAS VIAS DEL SECTOR 2

INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2015
S/. 278,728.27

RENDICIÓN DE CUENTAS



**PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2012**

Proyectos de Inversión Pública

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | 244412 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 01 , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 4,156,200.00 | 0.00 | Perfil en proceso de activación |
| 2 | 2 | 196991 | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5 , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | | 840,249.22 | 772,002.03 | Obra culminada 2016 |
| 3 | 2, 4 Y 5 | 211076 | MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SUB SECTORES 2-1, 2-6, 3-1, 4-3, 4-4 Y 5-4 , DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 640,061.10 | 18,750.00 | Expediente Técnico en revisión |
| 4 | 2 | 208486 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL- CASA DEL VECINO DEL SECTOR 02 SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. REPORTADO EN 2014 | 1,200,000.00 | | | |
| 5 | 3 | 193828 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. REPORTADO EN 2014 | | | | |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 6 | 3 | 202022 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E. N 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 119,008.24 | 116,177.18 | Ejecutado |
| 7 | 4 | 217339 | MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | 1,200,000.00 | 3,165,687.00 | 5,500.00 | Obra licitada |
| 8 | 5 | 217736 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (También en PP 2011) | 1,200,000.00 | 3,081,284.00 | 3,531,846.15 | Obra en ejecución |
| | | | | 7,200,000.00 | 12,002,489.56 | 4,444,275.36 | |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB SECTORES 2-2 Y 2-5



INVERSIÓN:
OBRA CULMINADA 2016
S/. 723,497.44

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

Proyectos de Inversión Pública



MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PARODI EN EL SUB SECTOR 4-I



**INVERSIÓN:
OBRA LICITADA
S/. 2'757,781.22**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

Proyectos de Inversión Pública



**CREACION E IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL
- CASA DEL VECINO DEL SECTOR 5**

**INVERSIÓN:
OBRA EN EJECUCIÓN
S/. 218,349.81**



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Proyectos de Inversión Pública



| N° | SECTOR | CODIGO SNIP | NOMBRE DEL PIP / PROPUESTA PRIORIZADA | MONTO ESTIMADO DEL P.P. S/. | MONTO VIABILIDAD DEL PIP S/. | MONTO DE INVERSION EJECUTADO * S/. | SITUACIONAL abril 2016 |
|----|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 1 | 168426 | MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. | 1,200,000.00 | 3,995,976.00 | 2,051,617.70 | Obra culminada y Liquidada en 2013 |
| 2 | 2 | 177828 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N. 100, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. | | 1,402,140.00 | 1,752,622.48 | PIP CERRADO en 2014 |
| 3 | 3 | 193828 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. REPORTADO EN 2014 | 1,200,000.00 | | | |
| 4 | 3 | 162082 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. | 1,200,000.00 | 639,097.89 | 513,974.60 | PIP CERRADO en 2014 |
| 5 | 4 | 168435 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. | | 2,980,265.00 | 2,042,076.46 | Obra liquidada en 2013 y PIP CERRADO en 2014 |
| 6 | 5 | 217736 | CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA. REPORTADO EN 2012 | 1,200,000.00 | | | |
| | | | | 4,800,000.00 | 9,017,478.89 | 6,360,291.24 | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Presupuesto Participativo Anual



| AÑO | MONTO ESTIMADO PPTO. PARTICIPATIVO S/. | MONTO VIABILIDAD S/. | % | MONTO DE INVERSION ACUMULADO POR EJECUTAR AL 2016 S/. |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 2016 | 11,000,000.00 | 9,920,065.88 | 90.18% | 9,700,614.00 |
| 2015 | 10,500,000.00 | 28,346,175.68 | 269.96% | 6,385,878.23 |
| 2014 | 10,000,000.00 | 22,964,613.75 | 229.65% | 11,473,712.72 |
| 2013 | 6,000,000.00 | 13,167,278.14 | 219.45% | 7,761,953.34 |
| 2012 | 7,200,000.00 | 12,002,489.56 | 166.70% | 4,444,275.36 |
| 2011 | 4,800,000.00 | 9,017,478.89 | 187.86% | 6,360,291.24 |
| TOTAL | 49,500,000.00 | 95,418,101.90 | 192.76% | 46,126,724.89 |

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Modernidad y eficiencia

EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN



| AÑO | PIA | PIM | EJECUCIÓN | AVANCE % |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2007 | 523,065 | 5,381,843 | 771,517 | 14.3 |
| 2011 | 12,128,257 | 32,676,300 | 18,276,189 | 55.9 |
| 2015 | 28,000,000 | 41,978,661 | 29,108,004 | 69,4 |

(*) Información al 31/12/2015
Fuente: Consulta Amigable MEF

**ADICIONALMENTE SE HAN
REALIZADO LAS SIGUIENTES OBRAS**

OBRAS

- Hacer de San Isidro una ciudad sostenible es construir la ciudad en torno al espacio público, porque es el lugar de encuentro e interacción que nos hace ciudadanos.



OBRAS

- **MÁS DE 49 MIL METROS CUADRADOS DE PISTAS REPARADAS**
- **MÁS DE 6 MIL METROS CUADRADOS DE VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES**



OBRAS: MEJORAMIENTO URBANO – VIAL

- Mejoramiento urbano vial
Av. Alberto del Campo
(entre Av. Salaverry y Av.
Juan de Aliaga)
- Mejoramiento de la **calle**
Miguel Dammert Muelle



OBRAS: MEJORAMIENTO URBANO – VIAL

- Construcción de veredas y sardineles en **calle Francisco Tamayo** (cuadra 2)
- Mejoramiento de la accesibilidad en el **Parque Benemérita Guardia Civil (ex La Pera)**
- Reparación de pisos en **Residencial Santa Cruz**
- Mejoramiento de la accesibilidad en el **cruce de las avenidas Camino Real con Pezet**
- **Mejoramiento de la señalización** (nomenclatura de calles)



OBRAS: REMODELACIONES



■ Parque Villarán



■ Parque Tamayo



■ Av. Cavenecia

ILUMINACIÓN



■ **Parque Villarán**



■ **Avenida Arequipa**



■ **Residencial Santa Cruz**

RIEGO TECNIFICADO

- Implementación en el parque Manuel Dammert
- Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego en 14 parques (malecón Bernales, bosque El Olivar, parques Grecia, Guatemala, Belén, Alayza, Antequera, Quiñónez, Santa Rosa, Gandhi, bermas centrales en avenidas Arequipa, Guardia Civil, Pérez Aranibar).



JUEGOS INFANTILES

- Remodelación en los parques **Del Trabajador Municipal, Guatemala y Dignidad**



JUEGOS INFANTILES

- Instalación en los parques **Juan Pablo II, Benemérita Guardia Civil (ex La Pera), Acosta, Quiñónez, Teniente Enrique Palacios, Belén, Trabajador Municipal**




MINIGIMNASIOS

- Instalación de minigimnasios en las **avenidas Parque Sur, Pablo Carrquiry, Del Parque Norte, Salaverry, Coronel Portillo y General Pezet**; el malecón **Bernales** y en los parques **Alfonso Ugarte, Talamantes, Dignidad y José Luis Bustamante y Rivero**.



DIVERTICANES ZONAS PARA MASCOTAS

- **Parques Bustamante y Rivero, Talamantes y Alfonso Ugarte.**

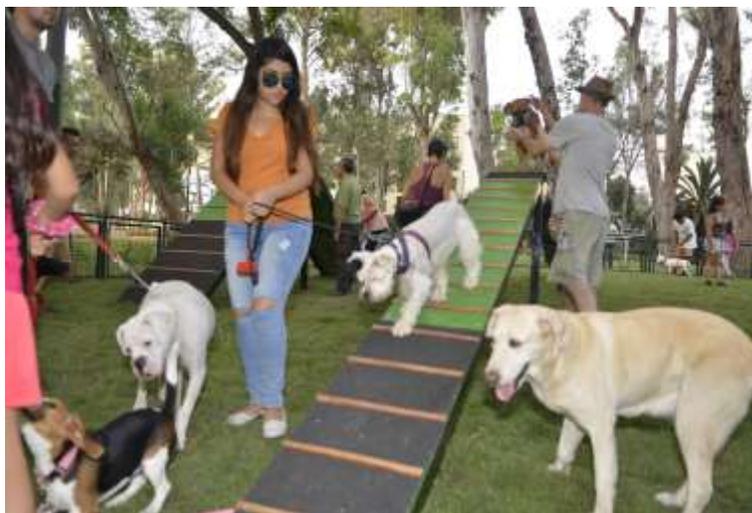

LO QUE SE VIENE...

- **Corredor Biosaludable** en las avenidas Del Parque Norte, Pablo Carriquiry y Parque Sur (ciclovías y minigimnasios)
- **Remodelación** de las avenidas República de Colombia, Del Parque, Canaval Moreyra y Juan de Arona
- Nuevo edificio para plataformas de atención
- **Remodelación** del Centro de Encuentro Vecinal Halcones
- Adquisición de dos modernas ambulancias



ÁREAS VERDES

- Hacer de San Isidro una ciudad sostenible es convertirla en una ciudad referente en el cuidado del ambiente, implementando proyectos pensados no solo para hoy, sino también para el mañana.



ÁREAS VERDES

- Programa “Al rescate del **Olivar**” (lavado, abonamiento, podas, control de enfermedades de 1,670 árboles de olivo, mantenimiento rutinario de las lagunas con microorganismos benéficos, estudio de peces).



ÁREAS VERDES

- Plantado de más de 600 árboles
- Recuperación fitosanitaria de 2,200 árboles
- Recuperación de 13,000 m² de área verde
- Rehabilitación de 20,000 m² de área verde
- Instalación de más 400,000 plantas ornamentales
- Poda de más de 12,000 árboles
- Lavado de más de 15,000 árboles
- Control fitosanitario en los 46 parques del distrito.





**MUCHAS
GRACIAS**
